

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 01 DE JULIO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2024 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓

LOCALIDAD: SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 10 VIVIENDAS FONDO: FAISMUN 2024 ✓ MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ✓

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. OSCAR HÉCTOR TEJO MUÑOZ ✓ N° DE CONTRATO: MAQ.195.FAISMUN.24/

INVERSIÓN APROBADA: \$ 475,000.00 ✓ INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 470,262.84 ✓ INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 470,262.84 ✓

FECHA DE NICIO DE CONTRATO: 03-abr-24 ✓ FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 01-jul-24 ✓ FECHA DE TERMINO REAL: 01-jul-24 ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN		
1.01	ABRAZADERA ANILLO BSMA4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
1.02	ABRAZADERA 0BS MEDIO ANILLO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.03	ABRAZADERA 2BS MEDIO ANILLO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.04	ABRAZADERA 2AG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.05	ABRAZADERA SOLERA 1BS CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.05	ABRAZADERA SOLERA 2BS CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.07	ABRAZADERA JC CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
1.08	AISLADOR POSTE 13-PD P-1323 (1C) . INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	26.00
1.09	AISLADOR 1R P-1323 (1C). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00
1.1	AISLADOR 3R P-1353 (310954). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.11	AISLADOR POLIMERICO 15KV T/ SUSP. CON HOR (33). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00

OPERADO

1.1
2024

**RAMO 33
FAISMUN**

ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

1.12	ALAMERE SUAVE CAL 4 AS-4. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.35
1.13	BASTIDOR B1 CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.14	BASTIDOR B3. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.15	BASTIDOR B4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.16	CABLE ACSR-1/3. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	294.00
1.17	CABLE DE CU-2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	9.00
1.18	CABLE DE RETENIDA 3/8. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	16.00
1.19	CARGA #90 DOMEXWELD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.2	CLEMA REMATE, RAL 8 CAL 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00
1.21	CONECTOR P/L NEA 8S-2/0T 6S-1/0T. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.22	CONECTOR AC504-82. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	21.00
1.23	CONECTOR ESTRIBO CAL 6-2/0 BURNY. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.24	CONECTOR EMPALME ALUMINIO TENSION MINIMA CAL 1/0 VCSE-44. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
1.25	CORTACIRCUITO SELMEC 15 KV 100 A. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.26	CRUCETA PR-200. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.28	CRUCETA PV-200. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
1.29	FUSIBLE UNIVERSAL 1 A 10 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.3	GUARDACABO G2. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.3	GUARDALINEA P/ACSR1/0. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	JGO	18.00

OPERADO

2024

RAMO 33
FAISMUN

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

1.32	MOLDURA RE. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.33	CRUCETA MUERTO CANAL 102X300 (CRUCM-01). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.41	REMATE PARA RETENIDA AG 3/8 RECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.42	TORRE DOBLE METALICA DE 12 MTS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, EXCAVACIÓN, ACARREOS, CONCRETO CICLOPEO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO PARA EL ANCLAJE DEL POSTE, EL SUMINISTRO DE LOS	PZA	2.00
1.43	TORNILLO MAQ. 16X63, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.44	TIRANTE T/RECTO DE ANGULO T2. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.45	VARILLA COOPER WELD 3 MTS 5/8" S/CONECTOR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
2	ADICIONALES		
2.01	RETIRO DE POSTE EXISTENTE INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE GRÚA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
2.02	RETIRO DE LÍNEA EXISTENTE 3F-4H INCLUYE: MANIOBRA DE RETIRO CON EQUIPO DE ALTURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	552.65
2.03	TRAMITE PARA REALIZAR LA REVICIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTO, ASI COMO LAS ACTAS DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES, GESTORIA DE C.F.E PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. INCLUYE: ELABORACION DEFINITIVOS, EXPEDIENTE Y CARPETAS INFORMATIVAS COPIAS FOTOSTATICAS DE PROTOCOLOS, INVENTARIO FISICO Y TODO LO NECESARIO PARA LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA.	TRAM	1.00
2.04	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO I, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 106 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 400 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE	PZA	1.00
AT	ATIPICO		
AT-01	CABLE NEUTRACÓN 2X1/0+ 1X2 ACSR, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	143.00

1538



2024


MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MJNIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<p>ENTREGA</p> <p>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</p>  <p>C. OSCAR HÉCTOR TEJO MUÑOZ</p>	<p>RECIBE POR EL MUNICIPIO</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</p>  <p>ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA TOLASCO</p>	<p>AUTORIDAD LOCAL</p>   <p>Timoteo Victoria Benit</p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO</p>
<p>RESIDENTE</p>  <p>ARQ. GERARDO RAMIREZ ROJO</p>	<p>SUPERVISOR</p>  <p>ING. MARTIN EDUARDO ANAYA MORALES</p>	

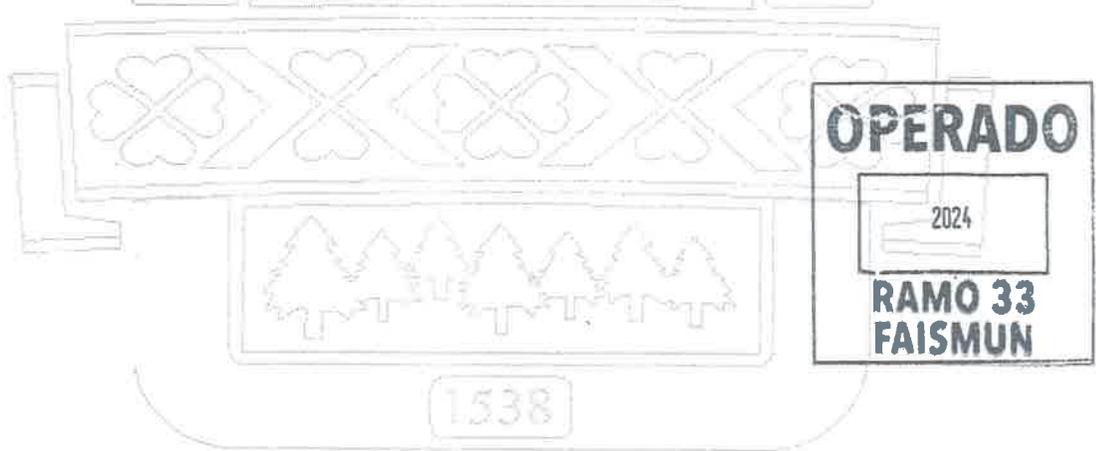

OPERADO
2024
**RAMO 33
FAISMUN**
