

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA 19 DE JULIO DEL 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	"FAISMUN 2024- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD EL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO."/		
LOCALIDAD	EL COYOTE /		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	471 HABITANTES	FONDO FAISMUN 2024 ✓	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ✓

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA	ING. JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA		Nº DE CONTRATO	MAQ.239.FAISMUN.24
INVERSIÓN APROBADA	\$ 1,000,000.00 /	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 997,698.80 /	INVERSIÓN EJERCIDA \$ 997,698.80.
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	21-may-24 /	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	19 DE JULIO DEL 2024 /	FECHA DE TERMINO REAL 19 DE JULIO DEL 2024 ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC. ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN EN URBANIZACIÓN.	M2	1200.00
1.02	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	239.80
1.03	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.04	EXCAVACION DE CEPAS A MANO PARA DENTELLONES EN MATERIAL TIPO "B". INCLUYE CARGA A MANO A CAMION Y RETIRO DE MATERIAL, AFINE DE FONDO Y DE TALUDES, PARA DESPLANTE DE LA CIMENTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	311.74
1.06	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES. INCLUYE EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	248.00
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO CON COLOR HARDENER PIGMENTADO (12% DE COLOR HARDENER POLVEADO, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO) ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	452.80
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	765.93
3.03	ADEMADO DE CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00

OPERADO

3.02
2024RAMO 33
FAISMUN


EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



3.04	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	11.05
3.05	FRANJA DE 1.00M X 4.00M COLADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR. ESTAMPADO CON LOGOTIPO DE AMEALCO ADMON CON LEYENDA" AMEALCO PROGRESO Y FELICIDAD" COLOR PROPUESTO POR SUPERVISION, COLOCADOS EN EL INICIO Y FINAL DE OBRA INCLUYE: SELLOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3.20
3.06	TOPE TRAPEZOIDAL DE TRANSITO VEHICULAR DE 0.40 - 0.60 - 0.40 MTS DE DESARROLLO Y UNA ALTURA AL CENTRO DE 0.08 MTS Y LARGO VARIABLE DEPENDE AL ANCHO DE VIALIDAD. ELEBORADO CON UN REVESTIMIENTO DE PIEDRA BOLA PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA AL 95 % DE SU P.V.S.M. PARA EL FORJADO DEL TOPE, SUMINISTROS, ACAFREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN (VER DETALLE)	ML	0.00
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MISMO PERFIL. RÓTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN. EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'C=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA. (VER DETALLE CIO-II)	PZA	1.00
4.02	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	968.70

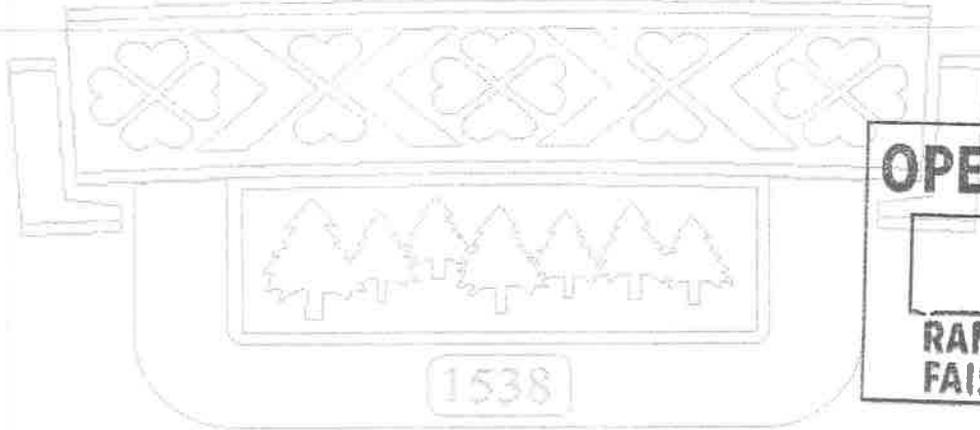

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA

EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

ING. JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA

SUPERINTENDENTE

ING. JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA

RECIBE POR EL MUNICIPIO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. ARO. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO

SUPERVISOR

ARO. JESUS MANCILLA PÉREZ

AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

PERLA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA
SUBDELEGADA MUNICIPAL
EL COYOTE

Perla María González García

NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

