

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 01 DE JULIO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO SIN NOMBRE, SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

LOCALIDAD: **SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO.**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: **20 HABITANTES** FONDO: **FAISMUN 2024** MODALIDAD DE EJECUCIÓN: **CONTRATO**

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: **C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MONDRAGÓN** N° DE CONTRATO: **MAQ.251.FAISMUN.24**

INVERSIÓN APROBADA: **\$ 500,000.00** INVERSIÓN CONTRATADA: **\$ 496,161.44** INVERSIÓN EJERCIDA: **\$ 496,161.44**

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: **11-may-24** FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: **09-jul-24** FECHA DE TÉRMINO REAL: **01-jul-24**

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS	M2	814.50
1.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	261.58
1.03	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO).	M3	0.00
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3-KM	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	162.90
2.02	FORJADO DE CUNETAS DE HASTA 1.30 MTS. DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B".	ML	0.00
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO CON COLOR MAX INTEGRAL (5% DE COLOR MAX INTEGRAL, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO). ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f.c.= 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO.	M2	345.80
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO A RAZON DE LA PROPORCIÓN 0.083 M3 DE PIEDRA POR 0.067 M3 DE TEPETATE, COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON.	M2	488.70
3.03	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2	ML	10.00
3.04	ARROPE DE HOMBRO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A UN 95% PROCTOR.	M3	7.33
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE. INCLUYE: ABRAZADERA DE 2", LLAVE DE INSERCIÓN, MANGUERA KITEC DE 1/2" (13 mm), COPLER REPARACIÓN KITEC DE 1/2", EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" O TEPETATE, PLANTILLA DE TEPETATE Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, APISONADO DEL RELLENO, CONSIDERANDO UNA LONGITUD MEDIA DE HASTA 4.00 m, SUMINISTRO, ACARREO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	0.00
4.02	ENCOFRADO DE TUBERIA DE CUALQUIER DIAMETRO CON CONCRETO F'c=200KG/CM2, R.N., AG. MAX. 3/4" HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO.	M3	0.00
4.03	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	392.68
4.04	BARTELETA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL RECTANGULAR DE CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO.	PZA	1.00

OPERADO

2024

RAMO 33
FAISMUN

EL PROGRAMA DE OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO




GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.


ENTREGA

EJECUTOR Y/O CONTRATISTA



C. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MONDRAGÓN


RESIDENTE



ING. HUGO CESAR COLÍN MIRANDA


RECIBE POR EL MUNICIPIO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO

SUPERVISOR



ARQ. JESÚS MANCILLA PÉREZ


AUTORIDAD LOCAL



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
DELEGACIÓN
SAN ILDEFONSO
TULTEPEC



Timoteo Vázquez Beato
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

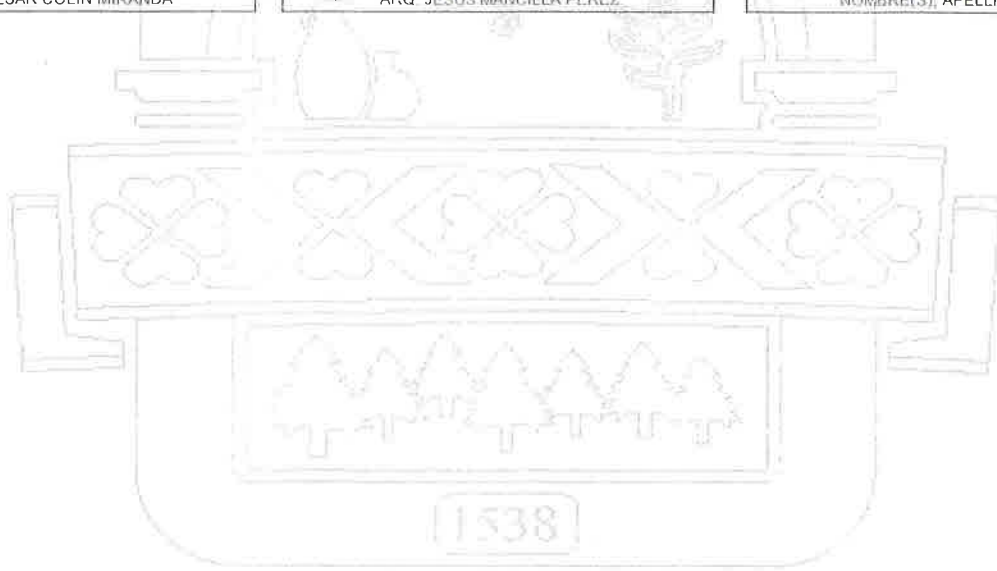

OPERADO

2024

**RAMO 33
FAISMUN**
