

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 27 DE JULIO DE 2024 ✓

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CAMINO HACIA LA BOMBA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓

LOCALIDAD: EL CAPULÍN, AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

15 HABITANTES

FONDO: FAISMUN 2024

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. LEONEL MONDRAGÓN RIVAS

N° DE CONTRATO: MAQ.259.FAISMUN.24 ✓

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 495,620.60

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 495,620.60 ✓

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 29-may-24

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 27-jul-24

FECHA DE TERMINO REAL: 27-jul-24

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	M2	700.00
1.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	M3	174.93
1.03	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	M3	19.70
1.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO).	M3	256.96
1.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A KILOMETRO SUBSECUENTE (MEDIDO SUELTO).	M3/KM	0.00
2	TERRACERIAS		
2.01	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS.	M2	0.00
2.02	FORJADO DE CUNETAS DE HASTA 1.30 MTS. DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "E".	ML	100.00
2.03	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	102.00
3	REVESTIMIENTO		
3.01	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c = 200 kg/cm2.	ML	12.00
3.02	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO	M2	427.00
3.03	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO CON COLOR HARDENER PIGMENTADO (12% DE COLOR HARDENER POLVEADO, RESPECTO AL PESO TOTAL DEL CEMENTO), ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO	M2	200.00
3.04	ARROFE DE HOMBRO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A UN 95% PROCTOR	M3	7.50
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	609.44
4.02	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO.	PZA	1.00

OPERADO

2024

RAMO 33  
FAISMUN


EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.


2024

# MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
<p>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</p>  <p>C. LEONEL MONDRAGON RIVAS</p>	<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</p>  <p>ING. ARO. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO</p>	  <p>DAVID Campos Estrada</p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO</p>
<p>SUPERINTENDENTE</p>  <p>ING. YHOVANY RODEA HERNÁNDEZ</p>	<p>SUPERVISOR</p>  <p>ARQ. JESÚS MANCILLA PÉREZ</p>	

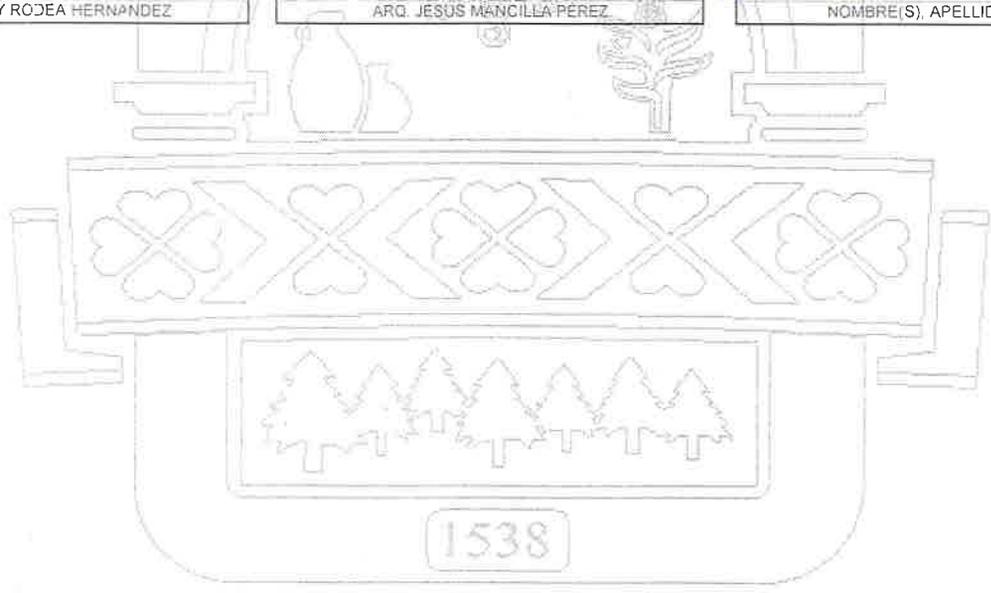

**OPERADO**  
2024  
**RAMO 33  
FAISMUN**

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES
