

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA:

28 de agosto de 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FAISMUN 2024 - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (AUDITORIO) Y CANCHA PÚBLICA EN LOMA LINDA, AMEALCO DE BONFIL, QRO."
LOCALIDAD: LOMA LINDA
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 471 HÁBITANTES FONDO: FAISMUN 2024 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V. N° DE CONTRATO: MAQ.300.FAISMUN.24
INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,200,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 1,194,730.12 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,194,730.12
FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 31-may-24 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 28-ago-24 FECHA DE TERMINO REAL: 28-ago-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. EN URBANIZACION.	M2	1533.530
2	ALBAÑILERIA		
2.02	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA INC: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	766.780
2.03	FABRICACIÓN DE BARRA PARA COCINA DE LOSA DE CONCRETO F'c 150 kg/cm2 DE 10CM DE ESPESOR ANCLADO AL MURO PERIMETRAL, CON ALTURA DE 1 M, ARMADA CON VAR 3/8" A GADA 30 CM, AMBOS SENTIDOS, CONSTRUCCION D EMURO DE TABIQUE, REPELLADO EN AMBOS LADOS. INCLUYE: CIMBRADO COMÚN, DESCIMBRADO, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	4.150
3	INSTALACION HIDRAULICA Y MOBILIARIO		
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA, INCLUYE 5 ML DE TUBOPLUS DE 13MM, 2 LLAVES ANGULAR DE 13MM Y DOS MANGUERAS FLEXIBLES DE 55CM DE LONGITUD, TARJA DE UNA TINA CON ESCURRIDOR TARJA 1T/1ESC DER 10X54 P/MEZ PISO, MEZCLADORA MARCA RUGO DE 8 PULGADAS, CESPOL DE ACORDEON MARCA COFLEX, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PRA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.000
4	INSTALACION SANITARIA Y MOBILIARIO		
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO, MODELO AC71000MX/Jofel COLOR GRIS CON VASO TRANSPARENTE, TAPA DE ACERO INOXIDABLE O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.000
4.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CON TAPA EN COLOR PLATA MODELO AE57030 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.000



2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



5	INSTALACION ELECTRICA Y MOBILIARIO		
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA UFO LED HIGH BAY CAMPANA 150W, LUZ DE DIA, IP65, INDUSTRIAL, LED INTEGRADO. MARCA TECNOLITE MODELO REGOR II, INCLUYE CABLE, 12 MTS DE TUBO CONDUID PARED DELGADA, ANDAMIOS, SOPORTES, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMNTO.	PZA	8.000
5.04	SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO PARA LUMINARIA CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO CHALUPA, CON POLIDUCTO DE 1/2" Ø OCULTO EN MURO, PISO Y LOSA. 5.00 MTS DE LONGITUD PROMEDIO, CEDULA: 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12, 1 HILO DE CABLE DESNUDO CAL.14 EMPLEANDO CABLE CONDUMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: TUBERÍA, CONECTOR RECTO Y CURVO, GUÍA, CAJA DE REGISTRO, CABLE, RANURADO, RESANE DE RANURAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, CORTES DE TUBO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	15.000
7	LOSA		
7.01	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO IMPERQUIMIA SBS PS 4 MM DE POLIESTER GRANULAR COLOR TERRACOTA O SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO, Y GARANTÍA. INCLUYE 8 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RASPADO Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINANTE, UNA MANO DE IMPERCOAT PRIMARIO, RESANTE EN GRIETAS, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	141.340
8	ACABADOS		
8.01	PISO BAIKAL GRIS TAUPE 40 X 40 CMS MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN MARCA, PRECIO Y GARANTÍA, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO Y JUNTAS A TOPE CON BOQUILLA COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION INC CORTE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	160.740
8.02	AZULEJO CERAMICO TREKKING® GEOMETRIC MIX 40 X 60CM MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN MARCA, PRECIO Y GARANTÍA, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO Y JUNTAS A HUESO INC : CORTE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	27.710
8.03	PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES, HASTA 4.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1222.460
8.04	ZOCLO DE 7 CM DE ALTURA ALPINO LUNGO DE 20X60 CM MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN MARCA, PRECIO Y GARANTÍA, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO Y JUNTAS A TOPE CON BOQUILLA COLOR CLARO INC CORTE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	31.160
8.06	ESPEJO PARA BAÑO DE 40 X 75 CM, CON MARCO SEMILUJO DE ALUMINIO NEGRO Y CUERPO DE VIDRIO DE 6 MM, SEGÚN DETALLE EN PLANO DE PROYECTO. INCLUYE: FIJACIÓN, INSTALACIÓN, SUMINISTRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.000
8.07	PINTURA ESMALTE EN ELEMENTOS DE HERRERÍA, HASTA 4.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	113.520
8.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN CUADRICULADO FISSURED O SIMILAR SUSTENTADO CON PERFILES DE ALUMINIO DE 1" PANELES DE 61X81, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	119.100
9	GRADA Y AREA DE JUEGOS		
9.01	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	184.130
9.07	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS FRÍAS C/ 3 MTS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	34.880
9.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO ROJO 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON PROTECCIÓN CON MALLA ANTI-MALEZA, INCLUYE MATERIAL, SELECCION A VOLTEO, EXTENDIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	40.680

OPERADO

2024

RAMO 33

PRESUPUESTO

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

9.09	ADOCRETO TIPO CRUZ ROMANA COLOR GRIS Y ROSA DE 25 X 23.5 X 7 CM ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE RIO DE 4 CM. DE ESPESOR Y JUNTEADO CON ARENA INCLUYE: MATERIAL, MONO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA S CORRECTA EJECUCION.	M2	53,540
9.1	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5,970
10	AREA DE CANCHA		
10.01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CUALQUIER RESISTENCIA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4,330
10.04	RELLENO EN PLATAFORMA CON TEPÉTATE DE BANCO COMPACTADOS AL 80 % DE SU P.V.S.M., EN UNA CAPA DE 15 CMS, INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	7,540
10.06	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA MULTIUSOS INP-CUM13 (PORTERÍA DE FÚTBOL SOCCER CON CANASTA DE BALONCESTO) PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL, FABRICADA CON TUBO DE 2 1/2" CED. 30, EXTENSIÓN PARA SOPORTAR EL TABLERO DE BASKETBOL, CON TUBO DE 2 1/2" CED. 30, RETIRO DE TABLERO DE ACRILICO, INSTALACIÓN DE TABLERO DE ACRILICO DE 9 MM, CON LOGOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ESCUDO MUNICIPAL. INCLUYE: LIJADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEJANDO EL ÁREA LIBRE DE POLVO, GRASA Y FALSAS ADHERENCIAS, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR DESIGNADO POR LA SUPERVISIÓN, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2,000
10.07	FIRME DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO HIDRÁULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	54,160
10.08	PINTURA TOP DEPORTIVO EN PISO DE CANCHAS, MARCA COMEX COLOR (BLANCO, ROJO Y VERDE) INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON ACIDO MURIÁTICO MARCA COMEX, SELLADOR TOP ADHETOP FM MARCA COMEX, PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	376,430
10.09	CUNETA DE CONCRETO SIMPLE DE 1.00 MT DE DESARROLLO DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO PULIDO Y RAYADO, JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO AGUA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	64,180
11	MOBILIARIO URBANO		
11.01	MONTABLE INFANTIL TEMATICO MODELO 4MON400 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: PLACA DE SUJECIÓN, TAQUETES EXPANSIVOS COMO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ARMADO EN EL SITIO, FIJADO EN EL PISO FIRME, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1,000
11.03	ESTRUCTURA EJERCITADORA CLASICA, MODELO E12ELI-TUB PLAY CLUB. ELÍPTICA PARA FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES CARDIO PULMONAR Y DESARROLLO DE LA MUSCULATURA DE PIERNAS Y HOMBROS. MEDIDAS: 107 X 053 X 161 CMS, FABRICADOS CON TUBO DE 4", 2 1/2", 2", 1 1/4" Y 1" CED. 30, PTR DE 2" X 2", PLACA DE 1/4" Y HUELLAS DE LÁMINA. ARMADOS CON PROCESO EN SOLDADURA, MIG CON PRE-TRATAMIENTO EN FOSFATO DE FIERRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RESISTENTE A RAYOS UV. LIBRE DE METALES PESADOS RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSIÓN O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: INCLUYE PUÑOS Y REMATES PLÁSTICOS CON PROTECCIÓN UV, SISTEMA DE FLECHAS Y BALEROS DE ALTA RESISTENCIA PARA GENERAR LOS MOVIMIENTOS Y TORNILLERÍA NECESARIA PARA SU ARMADO E INSTALACIÓN. PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE DE LA MISMA ESTRUCTURA, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA, ARMADO EN EL SITIO, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO REQUERIDO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA POR UN PERIODO MINIMO DE 5 AÑOS DESPUÉS DE LA ENTREGA.	PZA	1,000



2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

11.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BASURERO (PLAY CLUB) DOBLE DE METAL DE 1.11X0.43X1.35 CON CAPACIDAD APRA 136 LITROS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS INCLUYE: ARMADO EN EL SITIO, MANIOBRAS, INSTALACIÓN, ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1,000
12	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
12.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1180,550
12.02	LIMPIEZA DE CRISTALES POR LOS DOS LADOS. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3,500
12.03	LIMPIEZA DE MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	18,000
AT	ATÍPICOS		
AT-01	SALIDA DE PVC DE 4" DE BAJADA PLUVIAL DE CUBIERTA, HASTA UNA ALTURA DE 1.00 CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 45.00M, INCLUYE CORTES, CODOS DE 90° DE 4", TEES DE 4", COPLES, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SALIDA	1,000
AT-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADOR A BASE DE CHAPOPOTE EN MURO A UNA ALTURA DE 3.50M DE ALTURA, A DOS MANOS CON RÓDILLO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	87,500
AT-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA EN PLAFON MARCA TECNOLITE 40W DE 60X60CMS HASTA UNA ALTURA DE 3.00M INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	11,000
AT-04	ROTULO Y MURAL DE UNA ÁREA PROMEDIO DE 9M2 SEGUN DISEÑO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN CON PINTURA VINILICA EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 4.00M INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1,000



2024


MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
		
CONSTRUCTORA COLUMBUS S.A. DE C.V.	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021-2024 JORGE DE LA O SANCHEZ SUBDELEGADO MUNICIPAL EDUARDO AMARAL
SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR	
		Jorge de la O Sanchez NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

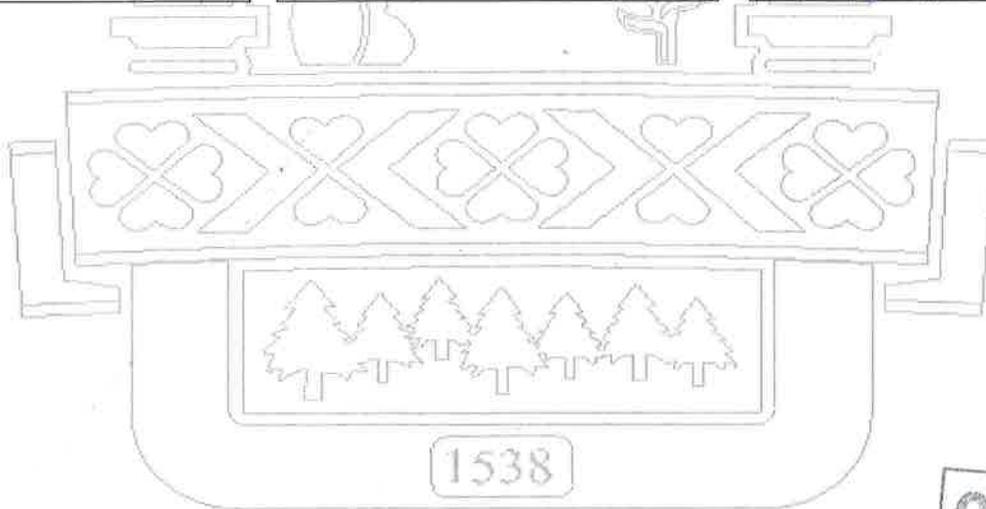

OPERADO
 2024
 RAMO 33
 FAISMUN
