

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2024 ✓

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "FAISMUN 2024 - REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DE AMEALCO DE BONFIL LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), LOS ÁRBOLES, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), SANTIAGO EL CACAHUATE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL, QRO." /

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

2500 HABITANTES

FONDO: FAISMUN 2024 ✓

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.V.

N° DE CONTRATO: MAQ.359.FAISMUN.24 ✓

INVERSIÓN APROBADA: \$ 2,800,000.00 /

INVERSIÓN CONTRATADA \$ 2,783,924.87 ✓

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 2,783,924.87 ✓

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

06-ago-24 ✓

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 04-oct-24 ✓

FECHA DE TÉRMINO REAL: 28-ago-24 /

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	ALUMBRADO		
1.01	BRAZO GALVANIZADO TIPO I DE 1.20 MT. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	251.00
1.02	ABRAZADERA SOLERA 2BS CONHESA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	249.00
1.03	CABLE THW CAL. 14 THW. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPÉRDICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1140.69
1.04	CONECTOR DER. P/ALUMBRADO, CAL. 14-2 HOMAC. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	744.00
1.05	LUMINARIO ZM-1039 COLOR WW/CW DE 100W AC85-265V, FABRICADO CON ALUMINIO DE 11000 LUMENS IP66 CON TAMAÑO 680X255X95mm. O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETE AL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	254.00
2	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
2.01	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO I, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 106 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 400 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ÉSMALTE ALKIDALICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA. POR LA SUPERVISIÓN, UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MIMO PERFIL, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F' C=150KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPÉRDICO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA. (VER DETALLE CIO-TI).	PZA	1.00

OPERADO

2024

RAMO 33  
FAISMUN

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024


MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
 CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.V.	 ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 ING. SET FLORES URRUTIA	 ING. MARTIN EDUARDO ZANAYA MORALES	 Héctor Hugo Carrillo Ríos NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

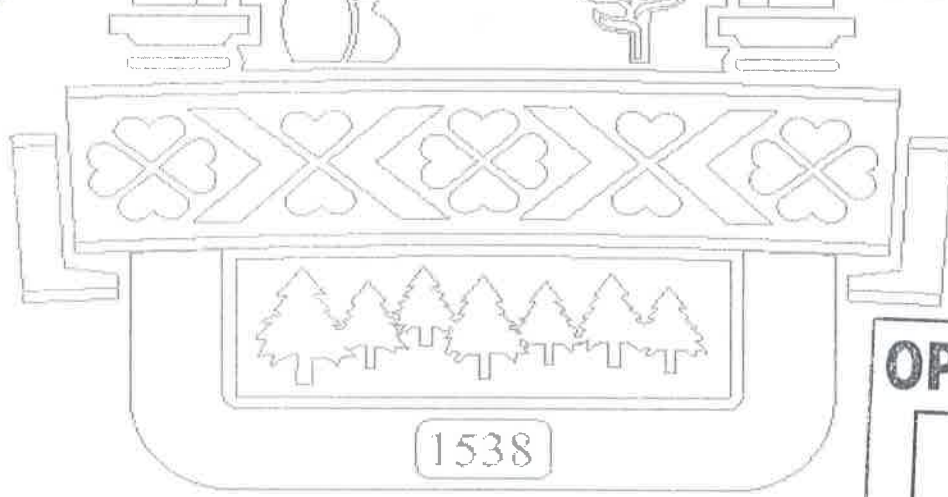

1538

**OPERADO**

2024

**RAMO 33  
FAISMUN**
