

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA 09 DE AGOSTO DE 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2024-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL, GIMANSIO AL AIRE LIBRE Y ALUMBRADO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD	LA MURALLA, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	422 HABITANTES	FONDO FAISMUN 2024	MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.		N° DE CONTRATO	MAQ.303.FAISMUN.24
INVERSIÓN APROBADA	\$ 1,600,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA	\$ 1,584,159.60	INVERSIÓN EJERCIDA \$ 1,584,159.60
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	11-jun-24	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	08-sep-24	FECHA DE TERMINO REAL 09-ago-24

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS INC ESTACAS MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION EN URBANIZACION.	M2	729.75
1.02	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCION EXISTENTE HASTA 2 50 M DE ALTURA, CUALQUIER MATERIAL Y RESISTENCIA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	31.77
1.03	DESMONTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES EN LA CAPA SUPERFICIAL, CONSIDERANDO UN ESPESOR DE 15 CM INCLUYE EL CORTE/RETIRO DE MALEZA Y OBSTRUCCIÓN VEGETAL, MANIOBRAS DE ACOPIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	592.53
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM. PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA.	M3	180.98
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES	M3/KM	180.98
2	PARTIDA 2: TRABAJOS EN EXPLANADA EXISTENTE		
2.01	LIMPIEZA Y DESYERBE DE LA PLAZA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE ACARREO LIBRE DENTRO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS O APIE DE VEHICULO DE TRANSPORTE, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIO	M3	0.00
3	PARTIDA 3: TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y ANDADORES		
3.01	ESCARIFICADO, CONFORMADO, AFINADO Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL O BASE DE TEPETATE EXISTENTE AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y CALIDAD CONFORME A NORMA, INCORPORACIÓN DE AGUA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
3.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS, INCLUYE MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS, AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	33.59
3.03	RELLENO EN PLATAFORMA CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADOS AL 80% DE SU P.V.S.M., EN UNA CAPA DE 15 CMS, INCLUYE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	71.33
3.04	ADOCRETO TIPO CRUZ ROMANA COLOR GRIS, ROSA O NEGRO DE 25 X 23.5 X 7 CM ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE RIO DE 4 CM DE ESPESOR Y JUNTEADO CON ARENA SEGUN EL DISEÑO QUE DIGA LA SUPERVISION INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	142.80
3.05	PISO A BASE DE PORFIDO CUBO IRREGULAR DE 4 A 6 CM COLOR ROSA, CON TRAZO RADIAL, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, Y BOQUILLA CON MORTERO DE 10 A 20MM, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 5CM. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	0.00
3.06	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCION C/2.50 MTS INC: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	79.38

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES

2024


MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

3 07	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 30 CMS DE SECCION, CONCRETO F'c = 150 kg/cm2. ELABORADO CON REVOLVEDORA AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS FRIAS C/ 3 MTS. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	128.34
3 08	PINTURA PARA TRAFICO VEHICULAR BASE SOLVENTE ROAD DEPOT O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD COLOR AMARILLO CON MISCROESFERA DE VIDRIO TIPO S-3 (0.70 KG/LT) CON DISEÑO SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE INCLUYE DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA A RECUBRIR, TRAZO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES LOCALES Y FORANEOS DE LOS MATERIALES, AL SITIO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	ML	60.48
3 09	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P V S M INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	45.01
4	PARTIDA 4. MOBILIARIO URBANO		
4 01	MESA PICNIC DE METAL DE 3 31X3.13X2.35 CON CLAVE 8MES46-S DE LA MARCA PLAY CLUB O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE FLETES AL SITIO DONDE SE REQUIERE EL INSUMO, ARMADO EN EL SITIO, MANIOBRAS LOCALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3.00
4 02	BANCA DE METAL CON DESCANSABRAZOS DE 1.59X0.73X0.075 M O SIMILIAR EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE FLETES AL SITIO DONDE SE REQUIERE EL INSUMO, ARMADO EN EL SITIO, MANIOBRAS LOCALES DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6.00
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BASURERÓ (PLAY CLUB) DOBLE DE METAL DE 1 11X0.43X1.35 CON CAPACIDAD APRA 136 LITROS ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, LIBRE DE METALES PESADOS INCLUYE ARMADO EN EL SITIO, MANIOBRAS, INSTALACIÓN, ANCLAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
5	PARTIDA 5. ÁRBOLES Y PLANTAS		
5 01	TIERRA VEGETAL EN MONTICULOS, INC SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, TRASPALO, COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	41.19
5 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL PATA DE VACA DE 2.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE RIEGO DURANTE 5 DIAS HASTA SU ESTABLECIMIENTO DEFINITIVO, ARROPE CON TIERRA VEGETAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
5 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO NATURAL KIKUYO EN ROLLO. INCLUYE SUMINISTRO, PREPARACIÓN DEL TERRENO, ACARREOS, COLOCACIÓN, RIEGO DURANTE 10 DIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	161.00
5 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPA DE ORO DE 2 00 MTS DE ALTURA, INCLUYE RIEGO DURANTE 5 DIAS HASTA SU ESTABLECIMIENTO DEFINITIVO, ARROPE CON TIERRA VEGETAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	6 00
5.05	LIRIO PERSA (5 PZA POR M2) INC SUMINISTRO, COLOCACION, RIEGO DURANTE 5 DIAS HASTA SU ESTABLECIMIENTO DEFINITIVO, ARROPE CON TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	27 00
5 06	LAVANDA (5 PZA POR M2) INC SUMINISTRO, COLOCACION, RIEGO DURANTE 5 DIAS HASTA SU ESTABLECIMIENTO DEFINITIVO, ARROPE CON TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	26.71
6	PARTIDA 6. KIOSKO		
6 01	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" INC MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFINE, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2.46
6.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.00
6 03	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA.	M3	74.55
6 04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3/KM	46.87
6 05	RELLENO EN PLATAFORMA CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADOS AL 80% DE SU P V S M EN UNA CAPA DE 15 CMS, INCLUYE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	11.74
6 06	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	7.79

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALCANZO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES



2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

6.07	PLANTILLA DE CONCRETO, DE 5 CMS DE ESPESOR, F' C= 100kg/cm ² , HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INC. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	10 55
6.08	CADENA DE 15X25 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM ² , ACABADO COMÚN, ARMADA CON ARMEX 10*20, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16 69
6.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA NEGRA DE 40*40 DE 3 CM DE ESPESOR, EN COLOR NEGRA. COLOCACION EN FORMATO TAPETE ASENTADA CON CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON BOQUILLA DE CEMENTO BLANCO COLOR NEGRO INCLUYE MATERIALES, UNA MANO DE SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	114 84
6.1	FORJADO DE ESCALÓN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40 CM DE HUELLA Y 15 CM DE PERALTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1 3, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0 00
6.11	RECUBRIMIENTO DE ESCALÓN (HUELLA Y PERALTE) CON CANTERA ACABADO MATERLINADO A MÁQUINA, 40 CMS DE HUELLA Y 15 CMS DE PERALTE, DE 4 CMS DE ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON PASTA DE CEMENTO BLANCO - COLOR INC. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	0 00
6.12	COLUMNA DE CANTERA SECCIÓN CIRCULAR 30 CM DE DIÁMETRO DE 3 MTS DE ALTURA, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM ² , ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Ø Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, INCLUYE: 1 M DE ANCLAJE A CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA, UN CAPITEL SUPERIOR, UN CAPITEL INFERIOR, NIVELADO, PLOMEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	6 00
6.13	ESTRUCTURA DE QUIOSCO A BASE DE PERFILES HSS DE 8X3" DE 13.5 KG POR METRO LINEAL, CON LARGUEROS DE PTR DE 3X2 CAL 14 DE 3.72 KG POR METRO LINEAL, CON LA SEPARACIÓN QUE SE MUESTRAN EN LOS PLANOS, PINTADOS COLOR NEGRO CON PINTURA ESMALTE, INCLUYE: ANDAMIOS, SOLDADURA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	0 00
6.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GALVATEJA, COLOCADA HASTA 5 METROS DE ALTURA, INCLUYE: PIJAS DE ¼ X 1/4 X 1/2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN	M2	0 00
6.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRIPLAY ESTRIADO, BARNIZADO Y LIJADO, HASTA UNA ALTURA DE 8 MTS FIJADA AL MONTÓN CON PIJAS PUNTA DE BROCA DE 2" A CADA 50 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0 00
6.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDA EN ESTRUCTURA A-BASE DE PERFIL PTR 2"X2" CAL 14 DISEÑO COMO SE INDICA EN PLANO, DE UNA ALTURA APROXIMADA DE 95CMS DE ALTO, PINTADO A COLOR INDICADO POR SUPERVISOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	41 94
7	PARTIDA 7. VELARIA		
7.01	CORTE CON DISCO DIAMANTE EN PISO DE CONCRETO DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: AGUA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	24 00
7.02	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CUALQUIER RESISTENCIA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1 04
7.03	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	15 85
7.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA.	M3	20 61
7.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3/KM	20 61
7.06	PLANTILLA DE CONCRETO, DE 5 CMS DE ESPESOR, F' C= 100kg/cm ² , HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA INC. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	25 84
7.07	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 1.20 x 1.20, 0.10-0.15 m DE PERALTE, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON VAR N° 3 A/C 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS, TERMINADO COMÚN. INCLUYE CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, HECHURA, COLOCACIÓN, PICADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10 00
7.08	DADO DE 45 x 45 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm ² ARMADO CON 6 VAR N° 4 Y EST N° 3 A/C 15 CM INCLUYE CIMBRA APARENTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, PICADO Y CURADO DEL CONCRETO, HABILITADO DEL ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10 00

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

7.09	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90% DE SU P V S M INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	11.77
7.1	COLUMNA DE SECCION CIRCULAR DE 35 CM DE DIAMETRO DE CONCRETO F'c= 250 kg/cm2 ARMADO CON 6 VAR Nº 4 Y EST Nº 2 A/C 15 CM INCLUYE SONOTUBO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, PICADO Y CURADO DEL CONCRETO, HABILITADO DEL ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	10.00
7.11	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA ANCLA CIRCULAR FABRICADA CON ACERO DE 39 CM DE DIAMETRO DE 1/2" (12.6 MM) DE ESPESOR Y 4 ANCLAS DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 1.00M DE 5/8", ACERO GRADO 55 CON PLACA DE ASIENTO, TUERCA Y ROLDANA DE PRESION INCLUYE CARTABONES DE PLACA DE 13 MM DE ACUERDO A PROYECTO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	10.00
7.12	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE A BASE DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 4" (10 16 CM) DE DIÁMETRO CEDULA 40 (16 50 KG/ ML, 8.18 MM DE ESPESOR DE PARED), LONGITUD DE 3.00 M, SOLDADO A PLACA DE ANCLAJE. INCLUYE: PLACA CAPITEL, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALITICO, CORTES, EQUIPO, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	25.00
7.13	KIT DE ACCESORIO PARA VELARÍA TENSORES FLEXIBLES Y AJUSTABLES LOS TENSORES AJUSTABLES DE 6 A 8.6 PULGADAS. INCLUYE ARMADO EN EL SITIO, MANIOBRAS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	10.00
7.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOLDO DE SOMBRA TIPO PALOMA O A POSTES, A BASE DE MALLA SOMBRA IMPORTADA MARCA FORCE 340 COLOR NATURAL, O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, REFORZADA CON CABLE DE ACERO DE 1/2" PERMEABLE, PROTECCIÓN UV 95 %, 10 AÑOS DE GARANTÍA, INCLUYE: JUEGO DE ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE 316 PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	147.14
8	PARTIDA 8. ALUMBRADO		
8.01	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. EN SECO. INCLUYE. MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	21.29
8.02	ABRAZADERA OMEGA 1/2" + PIJA+ TAQUETE INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PZA	9.00
8.03	COPLER PARED DELGADA DE 1/2" INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	PZA	9.00
8.04	CABLE DE ALUMINIO 600V XLPE CAL 2x6+1x6 TIPO URD NEGRO SUBTERRANEO. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	100.75
8.05	COMBINACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO CONFORMADO DE TUBO CONDUIT P D DE 1-1/4" MCA CATUSA (3 PZA), FOTOCONTACTOR DE ALUMBRADO MCA TORK (1 PZA) CABLE THW CAL 8 AWG (40ML), INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 30 AMPER NOMINALES (1PZA), CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA TJ55 (1 PZA) BASE DE MEDICIÓN 4 TERMINALES CON + 1 TERMINAL ADICIONAL. CERTIFICADA POR CFE (1 PZA), FLEJE Y HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 3/4" 4 (JGO), MUÑA 1-1/4 (1PZA), COPLER PD 1- 1/4" (3PZA), CONECTOR TIPO AMERICANO 1-1/4"(1 PZA,) TUBO CONDUIT PD 1/2" (1.5ML) VARILLA ELECTRODO DE TIERRA DE 150 X3/8"(1PZA) INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
8.06	MANGA ABIERTA TERMOCONTRACTIL CRSM, CALIBRE 1/0 AWG, MARCA RAYCHEM O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN."	PZA	27.00
8.07	CONECTOR MÚLTIPLE SUBTERRANEO DE 4 VÍAS INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6.00
8.08	POLIDUCTO NARANJA CAPA INTERNA LISA DE 1 1/4" INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	ML	93.25
8.09	BASE DE CONCRETO HEXAGONAL PREFABRICADA DE 40X60X60 CM CN ANCLAS 19.5 CM. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓN, CARGA, DESCARGA, FLETE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
8.1	REGISTRO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE 40X40X40 CM CON TAPA INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓN, CARGA, DESCARGA, FLETE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
8.11	POSTE METÁLICO CÓNICO DE 7.00 MT DE ALTURA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00



2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

8 12	LUMINARIO PUNTA POSTE MARCA TECNOLED MODELO PT-100W INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	5 00
8 13	LUMINARIO PARA MONTAJE EXTERIOR MARCA TECNOLED O SIMILAR EN CARACTERISTICAS MODELO BPE-00312 INCLUYE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	0 00
8 14	LUMINARIO TIPO FAROLA COLGANTE ARGOS CAFÉ TH2850/5MCA TECNOLITE O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y PRECIO INCLUYE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1 00
8 15	WALLPACK TECNOLED MODELOWP100W-BB INCLUYE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3 00
8.16	CABLE THW CAL. 10 AWG INCLUYE. SUMINISTRO, HABILITADO, INSTALACIÓN, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	ML	214.41
8.17	CONECTOR DER P/ALUMBRADO CAL. 14-2H OMAC. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00
8 18	CONECTOR P/D TIPO AMERICANO 1/2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
8 19	TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1/2". INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
8 20	VARILLA COOPERWELD 3MTS 5/8" C/CONECTOR-TJ555. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
8.21	UNIDAD DE VERIFICACION ELÉCTRICA. INCLUYE TRABAJOS DE INGENIERIA PARA INTEGRACION DE PROYECTO, GESTORIA, VISITAS NECESARIAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERSONAL NECESARIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00
8 22	TRAMITES ANTE LA CFE PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE. TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	TRAM	1.00
9	PARTIDA 9. OBRAS COMPLEMENTARIAS		
9 01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	614 08
9.02	CARTELERÁ DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR. DE 2X2" CALIBRE 11 (4.701 kg/m), LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE ROTULOS EN VINIL AUTOADHÉRIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'c=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA.	PZA	1.00
10	PARTIDA 10. ATÍPICOS		
10.01	DENTELLÓN DE 15X30CMS SEMICIRCULAR DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	61 13
10.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO CORRUGADO NARANJA DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4 50
10.03	FIRME DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC. SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	104.82
10.04	ELEMENTO DE CONTENCIÓN (50CM DE ANCHO X 67.5 DE ALTO X 1 METRO) A BASE DE MURO DE BOBLE BLOCK MACIZO DE 14X20X40CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO -ARENA EN PROPORCIÓN 1.5 INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN PLOEO, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	78.81
10.05	RE NIVELACIÓN Y AFINE DE PLATAFORMA EXISTENTE A MANO POR MEDIO DE PIZON INCLUYE EL SUMINISTRO DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE TEPETATE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	142.80




2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

10.06	APLANADO REPELLADO A PLOMO Y REGLA DE 1.50 CM DE ESPESOR, HASTA 3.50 M DE ALTURA, EN MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1.6 ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS AL SITIO REQUERIDO, ANDAMIAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	50 00
10.07	SUMINISTRO, MONTAJE Y HABILITADO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA KIOSCO DE 6.00 M DE DIAMETRO MÁXIMO HECHO DE VIGAS PERIMETRALES A BASE DE HSS 4" X 3" Y VIGAS TRANSVERSALES DE HSS 4" X 3" CON UNA ALTURA NO MAYOR A 1.10 M DE ALTURA, SOLDADAS LAS UNIONES CON ELECTRODO 70-20 CON POSTES TRANSVERSALES PARA RECIBIR LA LÁMINA A ABSE DE PTR 3" X 2" @ 1.00 MÁXIMO, PINTADA CON PRIMER A DOS MANOS Y PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MISCELANEOS, HERRAMIENTA, HABILITADO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIOS PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1 00
10.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA PRINTO CAL 26 DE COLOR ROJO PARA CUBIERTA DE KIOSCO DE 6.00 M DE DIAMETRO MÁXIMO SUJETADA A POSTES TRNASVERSALES DE PRT DE 3" X 2" CON PIJAS AUTOTALADRANTES DE 1/4" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MISCELANEOS, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	26 62
10.09	LUMINARIO PARA MONTAJE EXTERIOR MARCA TECNOLED O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS MODELO BMS-048N2 INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6 00
10.10	FORJADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X13X26CMS DE 30CMS DE HUELLA Y 18 CMS DE PERALTE, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	17 90
10.11	RECUBRIMIENTO DE ESCALON (HUELLA Y PERALTE) CON CANTERA DE 4CMS DE ESPESOR CON ACABADO MARTELINADO A MÁQUINA, 30CMS DE HUELLA Y 18 CMS DE PERALTE, ASENTADO CON MORTERO CEM:ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADO CON PASTA DE CEMENTO COLOR BLANCO-COLOR, INCLUYE SUMINISTRO Y ACÁRREO DE LOS MATERIALES, UNA MANO DE SÉLLADOR AQUASİL LIFETIME MARCA IMPERQUIMA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	17 90

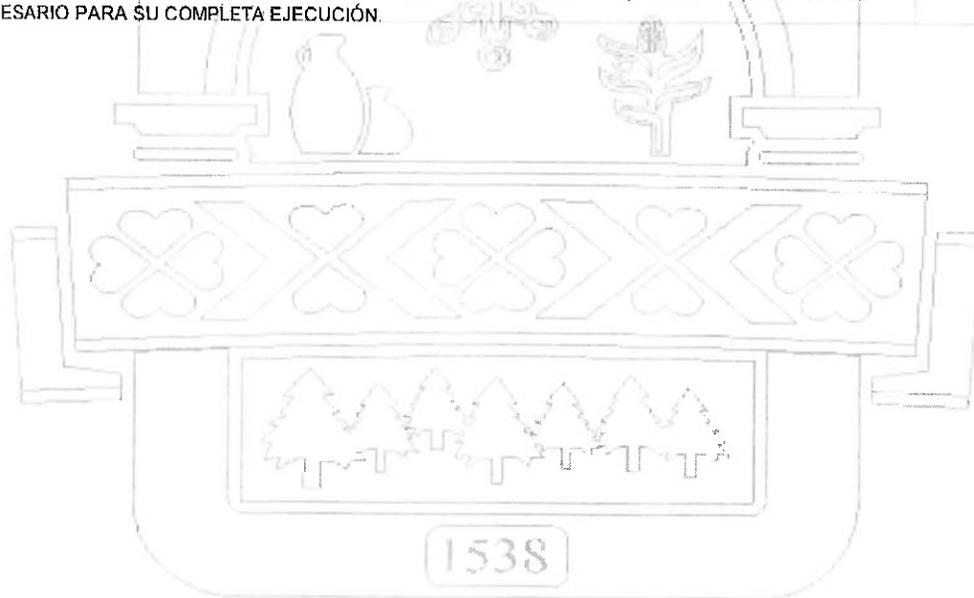

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	
SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES S.A DE CV	
RESIDENTE	
ING EMMANUEL GARCIA MERCADO	

RECIBE POR EL MUNICIPIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCIA NOLASCO	
SUPERVISOR	
ARQ. JESUS MANCILLA PEREZ	

AUTORIDAD LOCAL	
Miguel Navarrete	
NOMBRE(S), APELLIDOS FIRMA Y SELLO	

